



Měsíční zpráva o postupu prací



Odkanalizování a ČOV obcí Těšetice, Ústín

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.

za měsíc únor 2015



OHL ŽS



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti

Pro vodu
vzduch a přírodu



OHL ŽS

ODKANALIZOVÁNÍ A ČOV OBCÍ TĚŠETICE A ÚSTÍN

**MĚSÍČNÍ ZPRÁVA
ZHOTOVITELE**

02/2015



OBSAH

A. SITUAČNÍ ZPRÁVA PROJEKTU	3
Základní údaje	3
Financování projektu	3
Stav fakturace	3
Podzhotovitelé	4
Kvalita prací	4
Vzniklé nebo hrozící problémy a nedostatky a návrh nápravných opatření	4
B. ČINNOST ZHOTOVITELE NA PROJEKTU V HODNOCENÉM OBDOBÍ	4
Realizace	4
C. PLÁNOVANÉ ČINNOSTI V DALŠÍM OBDOBÍ	5
D. JEDNÁNÍ A OPATŘENÍ ZHOTOVITELE	5
Formální, neformální a pracovní jednání účastníků projektu	5
E. FOTODOKUMENTACE	6



A. SITUAČNÍ ZPRÁVA PROJEKTU

Tato měsíční zpráva zhotovitele byla vypracována k projektu „Odkanalizování a čištění odpadních vod obcí Těšetice a Ústín“ za únor 2015.

Základní údaje

Název díla	Odkanalizování a čištění odpadních vod obcí Těšetice a Ústín
Zadavatel	Svazek obcí Těšetice a Ústín
Realizační orgán	Státní fond životního prostředí
Projektant	Ing. Petr Poštulka
Provozovatel stokové sítě	
Dozor a řízení projektu	Staving engineering, spol. s r.o.
Zhotovitel	OHL ŽS, a.s.

Financování projektu

Cena bez DPH vč. rezervy	96.086.147 Kč
DPH z nabídkové ceny vč. rezervy	20.178.091 Kč
Celková cena	116.264.238 Kč

Stav fakturace

Za tento měsíc byla vydána faktura č. 1500838 ve výši **2.584.335,47 Kč bez DPH** (uznatelné náklady) a č. 1500835 ve výši **407.902,70 Kč bez DPH** (neuznatelné náklady).

Celkový stav fakturace projektu znázorňuje následující přehledná tabulka.

Faktura	Období	Číslo	Datum vystavení	Datum splatnosti	Celkem bez DPH [Kč]	Celkem s DPH [Kč]	Náklady
1	05/06/2014	1403108	2.7.2014	1.8.2014	5 062 189,12	6 125 248,84	uznatelné
2	07/2014	1403503	31.7.2014	30.8.2014	5 039 550,54	6 097 856,15	uznatelné
3	08/2014	1404080	1.9.2014	1.10.2014	2 923 037,81	3 536 875,75	uznatelné
4	09/2014	1404798	2.10.2014	1.11.2014	6 978 046,71	8 443 436,52	uznatelné
5	10/2014	1405476	5.11.2014	5.12.2014	9 792 814,66	11 849 305,74	uznatelné
6	11/2014	1405830	26.11.2014	30.12.2014	22 564 738,56	27 303 333,66	uznatelné
7	11/2014	1405886	28.11.2014	28.12.2014	1 210 479,91	1 464 680,69	neuzn.
8	01/2015	1500375	5.2.2015	7. 3. 2015	190 930,73	231 026,18	neuzn.
9	01/2015	1500377	5.2.2015	7. 3. 2015	5 540 157,81	6 703 590,95	uznatelné
10	02/2015	1500835	5.3.2015	4.4.2015	407 902,70	493 562,27	neuzn.
11	02/2015	1500838	5.3.2015	4.4.2015	2 584 335,47	3 127 045,92	uznatelné
	03/2015						
	04/2015						
	05/2015						
	06/2015						
Celkem					62 294 184,02	75 375 962,67	



Podzhotovitelé

Viz předaná tabulka na KD stavby.

Kvalita prací

Veškeré práce se provádějí na základě odsouhlasených technologických postupů a na ně navazujících technologických předpisů a kontrolních zkušebních plánů.

O všech zkouškách jsou průběžně vedeny příslušné zápisy ve stavebních denících a vystaveny náležité protokoly, jenž následně budou součástí dokladové části stavby při předání díla.

Vzniklé nebo hrozící problémy a nedostatky a návrh nápravných opatření

Práce probíhají dle aktualizovaného harmonogramu. Staveniště bylo zhotoviteli předáno v 05/2014, práce zahájeny dle pokynu objednatele.

V 09/2014 objednatel sdělil, že obdržel ROPD ze strany SFŽP s podmínkou refundace nákladů na čerpací jímky po podání chybějícího dokladu.

B. ČINNOST ZHOTOVITELE NA PROJEKTU V HODNOCENÉM OBDOBÍ

Realizace

Odkanalizování a ČOV obcí Těšetice a Ústín

- SO 02 - **Splašková kanalizace Těšetice**
Pokračování v pokládce tlakové kanalizace, provádění domovních ČS
 - SO 03 - **Splašková kanalizace Rataje**
Pokračování v pokládce tlakové kanalizace, provádění domovních ČS
 - SO 04 - **Dešťová kanalizace Vojnice**
Provádění prací na tomto objektu
 - SO 05 - **Splašková kanalizace Vojnice**
Pokračování v pracích, dokončení stavební části ČS
 - SO 06 - **Splašková kanalizace Ústín**
Provádění splaškové kanalizace, přípojek včetně RŠ, dokončení stavební části ČS
 - PS 02 - **Technologie ČS odpadních vod**
Probíhající montáže v Ústíně a Vojnicích
- Ostatní náklady

Podrobný výčet prací a dodávek je uveden ve fakturaci za daný měsíc.

C. PLÁNOVANÉ ČINNOSTI V DALŠÍM OBDOBÍ

Odkanalizování a ČOV obcí Těšetice a Ústín

- SO 02 - **Splašková kanalizace Těšetice**
Pokračování v pokládce tlakové kanalizace, provádění domovních čerpacích stanic (dále jen DČS), rozváděčů RP a napájecích kabelů pro DČS
- SO 03 - **Splašková kanalizace Rataje**
Pokračování v pokládce tlakové kanalizace včetně napájecích kabelů pro DČS
- SO 04 - **Dešťová kanalizace Vojnice**
Provádění prací na tomto objektu včetně domovních přípojek a RŠ
- SO 05 - **Splašková kanalizace Vojnice**
Pokračování v pracích, provádění domovních přípojek včetně RŠ



SO 06 - **Splašková kanalizace Ústín**

Provádění splaškové kanalizace včetně domovních přípojek a RŠ

SO 12 - **Terénní úpravy ČOV**

Provádění terénních úprav v závislosti na klimatických podmínkách

Ostatní náklady

D. JEDNÁNÍ A OPATŘENÍ ZHOTOVITELE

Formální, neformální a pracovní jednání účastníků projektu

Během tohoto měsíce proběhly 2 kontrolní dny stavby.

Mimo kontrolní dny probíhají pracovních porady všech zúčastněných stran. Na těchto poradách jsou operativně řešeny problémy vzniklé při výstavbě.

E. FOTODOKUMENTACE

Vypracoval: Ing. Daniel Vostřel

Schválil: Ing. Radek Pazdera



SO-03 Splašková kanalizace Rataje – elektro připojení plastové domovní ČS






SO-05 Splašková kanalizace Vojnice – provádění monolitické čerpací stanice ČS5



Výústní objekt u ČOV

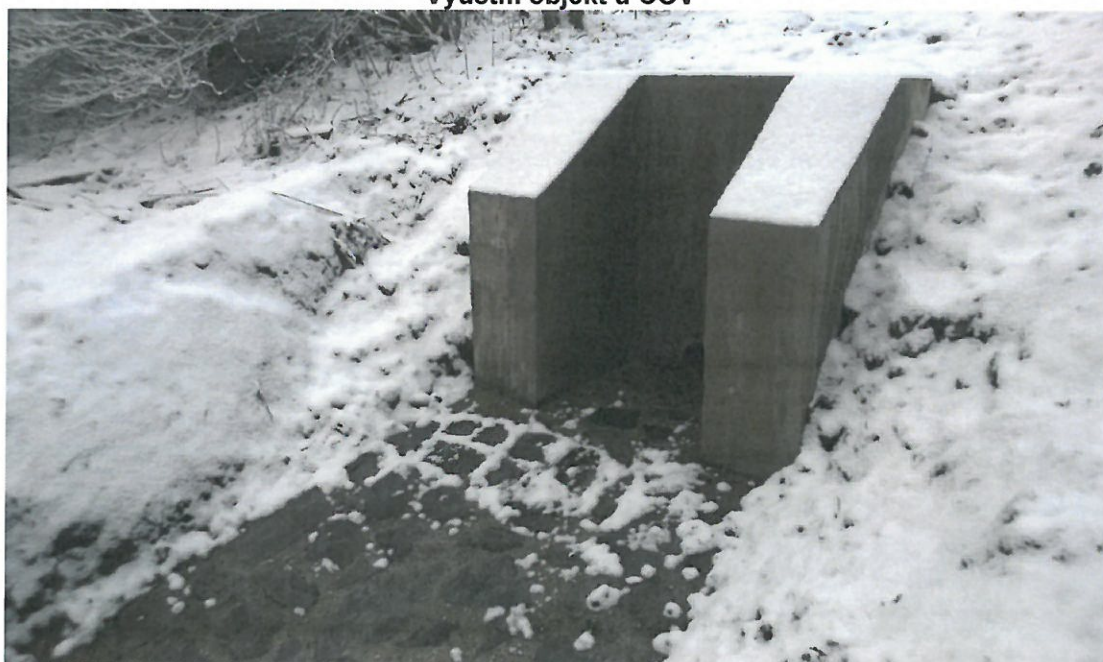



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti

Provozuje
soudržnost a přání



OHL ŽS

SO-06 Splašková kanalizace Ústín





OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti

Provozuje
veřejnou službu



OHL ŽS



