ČASOVÝ PLÁN VÝSTAVBY: ODKANALIZOVÁNÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD OBCÍ TĚŠETICE A ÚSTÍN

ID	Název úkolu
1	Zahájení prací
2	**Stavební objekty**
3	**SO 01 Jednotná kanalizace Těšetice**
4	Vyvložkování stávající kanalizace DN 500/750 - DN 300
5	Výtlak V1
6	Realizace ČS 1
7	Výtlak V2
8	Realizace ČS 2
9	Realizace OK 1, OK 2
10	**SO 02 Splašková kanlaizace Těšetice**
11	Kompletní provedení výtlaku po jednotlivých větvích
12	Vystrojení domovních čerpacích stanic
13	Provedení konečných povrchových úprav
14	**SO 03 Splašková kanalizace Rataje**
15	Realizace splaškové kanalizace Rataje
16	**SO 04 Dešťová kanalizace Vojnice**
17	Realizace dešťové kanalizace Vojnice
18	**SO 05 Splašková kanalizace Vojnice**
19	Realizace splaškové kanalizace Vojnice
20	**SO 06 Splašková kanalizace Ústín**
21	Realizace kanalizace Ustín
22	**SO 07 Vyčištění melioračního příkopu Rataje**
23	Provedení vyčištění melioračního příkopu
24	**SO 08 ČOV Těšetice**
25	Stavební práce
26	**SO 09 Příjezdní a vnitřní komunikace ČOV**
27	Provedení konstrukčních vrstev vozovky
28	Konečné povrchové úpravy
29	**SO 10 Přípojka el. energie na ČOV**
30	Kompletní provedení přípojky elektrické energie
31	**SO 11 Přípojka vody na ČOV**
32	Kompletní provedení přípojky vody, včetně VŠ
33	**SO 12 Terénní úpravy ČOV**
34	Komletní provedení hrubých terenní úprav
35	Ohumusování plocha osetí travním semenem
36	**SO 13 Oplocení ČOV**
37	Kopletní provedení oplocení
38	**SO 14 Propojovací potrubí ČOV**
39	Provedení MŠ, VU včetně nutných propojů
40	**SO 15 Telefonní přípojka**
41	Kompletní provedení přípojky
42	**Provozní soubory**
43	**PS 01 ČOV Těšetice**
44	Montáž technologického vybavení
45	**PS 02 ČS odpadních vod**
46	Montáž technologického vybavení
47	Příprava a zahájení zkušebního provozu ČOV
48	Ukončení a předání díla

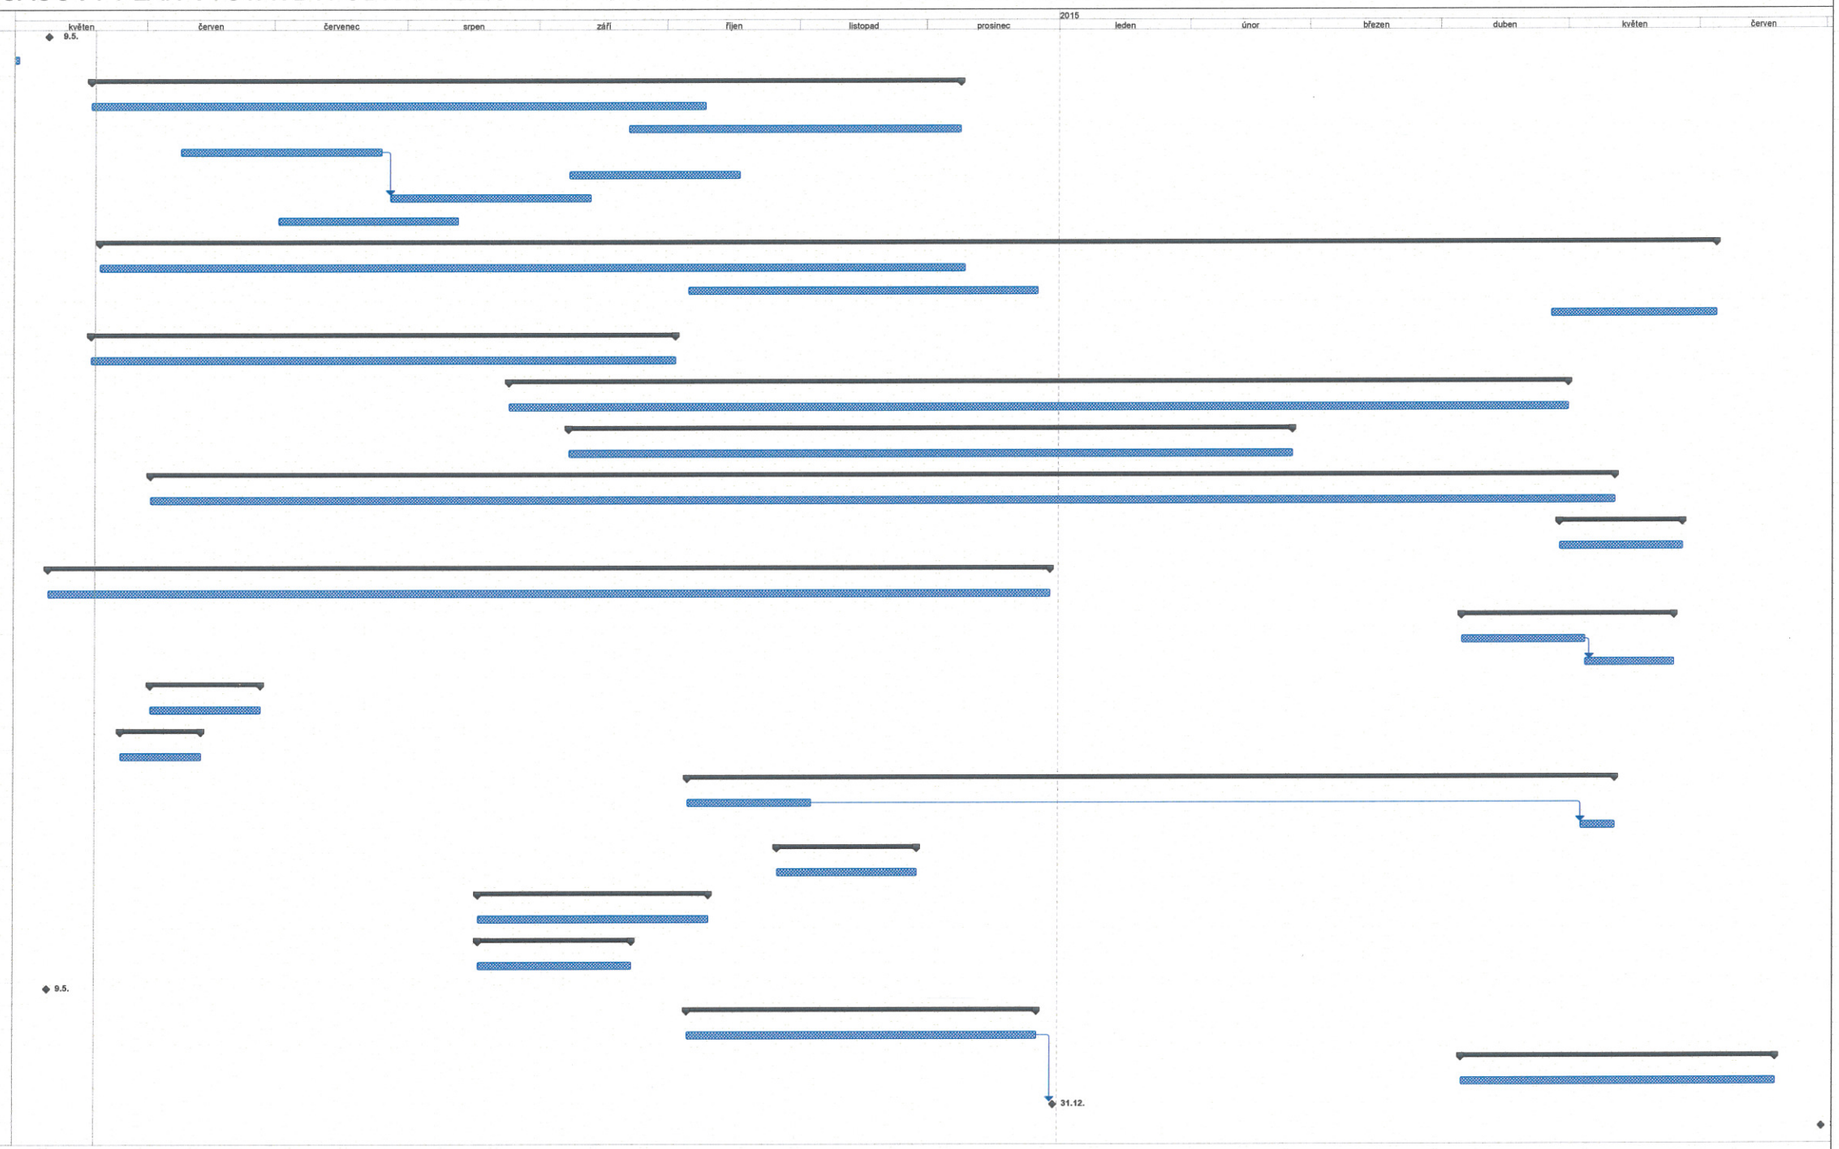

Projekt: HMG Těšetice aktual_upr
Datum: 20.5. 14

Úkol	Souhrnný	Vnější milník	Neaktivní milník	Pouze s dobou trvání	Pouze zahájení	Konečný termín
Rozdělení	Souhrn projektu	Neaktivní úkol	Neaktivní souhrn	Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu	Pouze s datem dokončení	
Milník	Vnější úkoly	Neaktivní úkol	Ruční úkol	Ruční souhrn	Průběh	
